


# Προγραμματισμός των έργων στο Διονυσιακό Θέατρο

## Ι. Ολοκλήρωση αποκατάστασης κεντρικού τομέα του Κοίλου του Διονυσιακού Θεάτρου

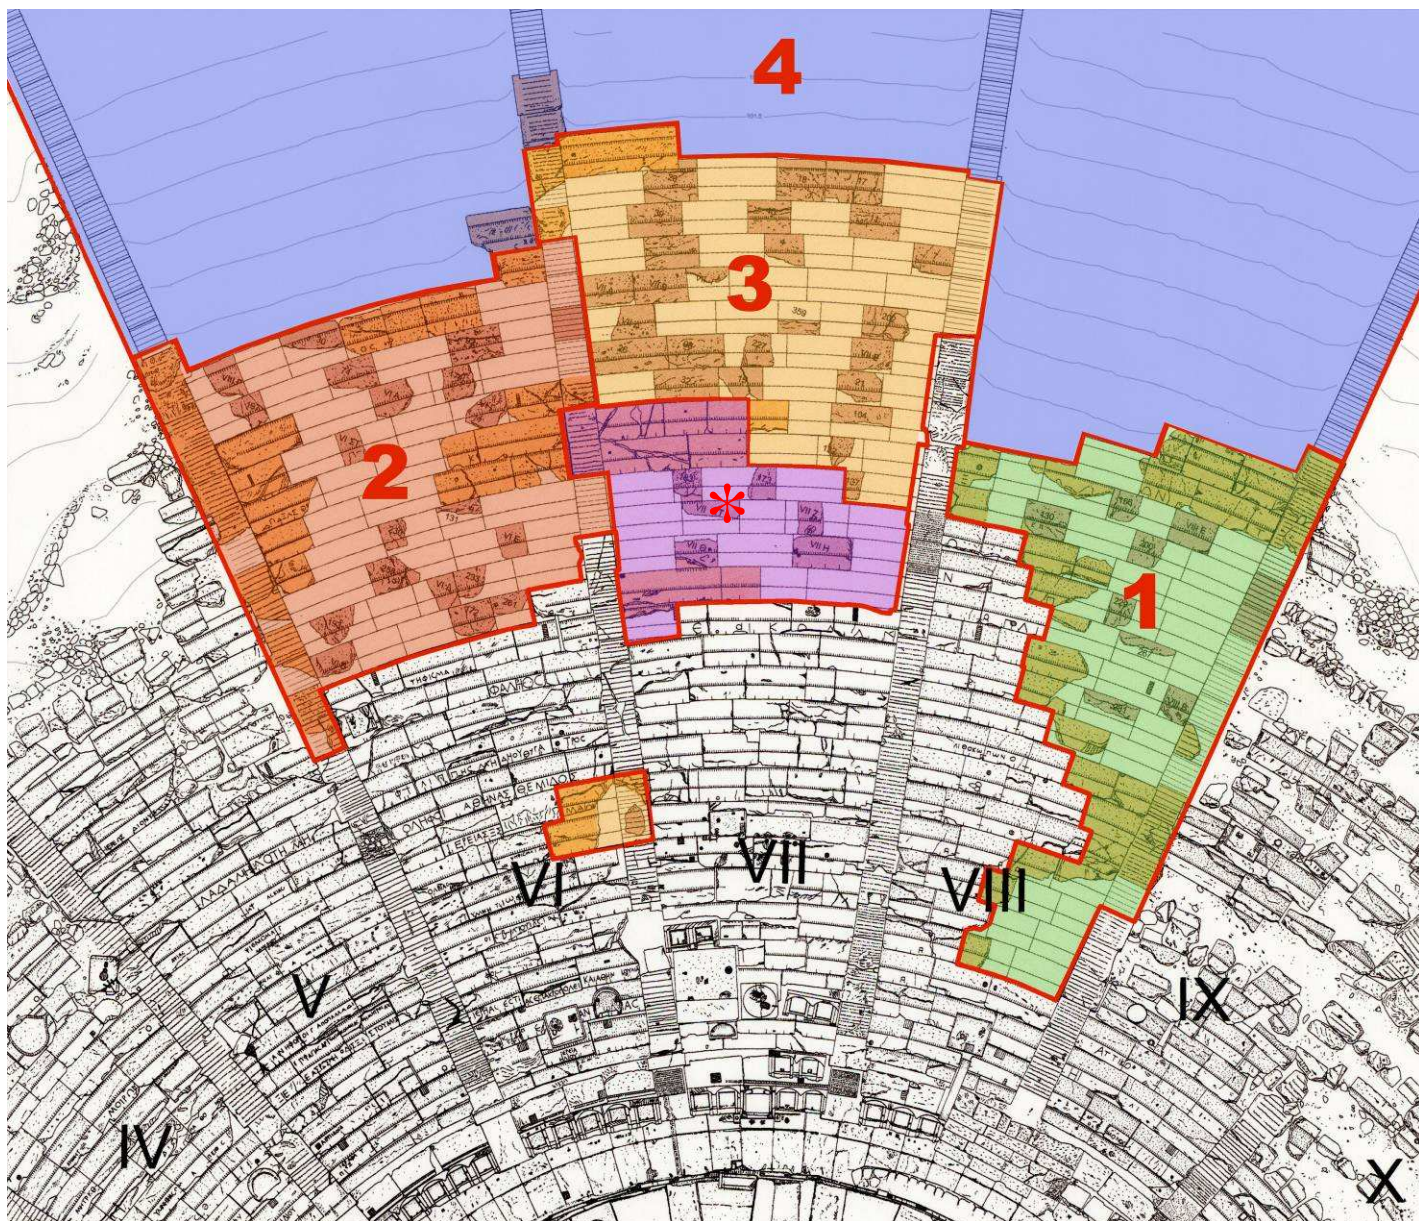


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΛΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ				
	Νέοι Λίθοι	Αρχαίοι λίθοι που απαιτούν συμπληρώσεις	Χρόνοι (σε μήνες)	
Οργάνωση Εργοταξίου	-	-		4
Τομέας 1 Αποκατάσταση Κερκίδας VIII	20	19		16
Τομέας 2 Αποκατάσταση Κερκίδας VI	24	20		18
Τομέας 3 Αποκατάσταση Κερκίδας VII	30	11		14
Τομέας 4 Αποκατάσταση Κλιμάκων και χωμάτων περιοχών μέχρι τον Περίπατο (Κεντρικός Τομέας)	164	-		20
Σύνολα	240	50		72

\* Τμήμα του εγκεκριμένου έργου που έχει ήδη εκτελεστεί




## Ολοκλήρωση αποκατάστασης του ανατολικού πλευρικού αναλήμματος του Θεάτρου

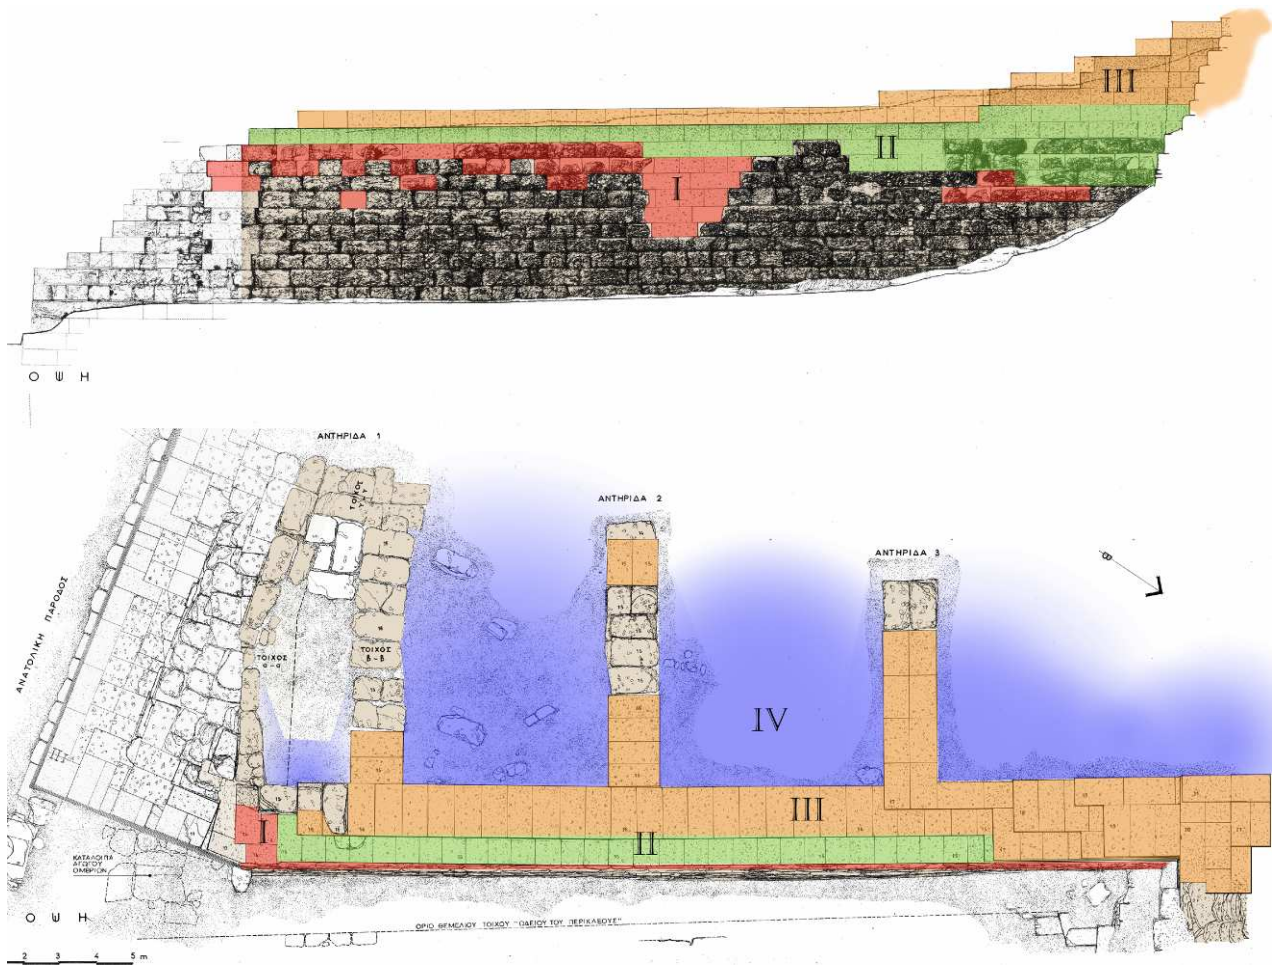


<b>Προγραμματισμός εργασιών στο ανατολικό πλευρικό ανάλημμα του Κοίλου του Διονυσιακού Θεάτρου</b>						
Τμήματα του μνημείου		Νέοι λίθοι	Συμπ/τα	Αρχαία διάσ/τα	Επιχωμ/ σεις	Χρόνοι (σε μήνες)
<b>I</b>	Αποκατάσταση των αποδομημένων κατώτερων τμημάτων του αναλήμματος και των αντηρίδων 2 & 3 (που καταχώθηκαν)	30	39	11	3 μ <sup>3</sup>	Εργασίες που έγιναν πριν την έναρξη της προγραμματικής σύμβασης
<b>II</b>	Επεμβάσεις στη 2 <sup>η</sup> -3 <sup>η</sup> αντηρίδα κατά μήκος του αναλήμματος και στη ΒΑ γωνία του (από το επίπεδο της 12 <sup>ης</sup> σειράς έως τη 16 <sup>η</sup> )	80	30	4	3 μ <sup>3</sup>	24
<b>III</b>	Εργασίες αποκατάστασης από τη 16 <sup>η</sup> έως την 21 <sup>η</sup> σειρά του αναλήμματος, της ΒΑ γωνίας του και στις ανώτερες ορατές στρώσεις των αντηρίδων 1, 2, και 3	90	30	2	3 μ <sup>3</sup>	24
<b>IV</b>	Επιχωμάτωση, διαμορφώσεις, επιχώσεις κατά μήκος του τοίχου και περιμετρικά των αντηρίδων 1, 2 και 3				15 μ <sup>3</sup>	3
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>200</b>	<b>99</b>	<b>17</b>	<b>24 μ<sup>3</sup></b>	<b>51</b>

# Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Χορηγικού Μνημείου του Θρασύλλου

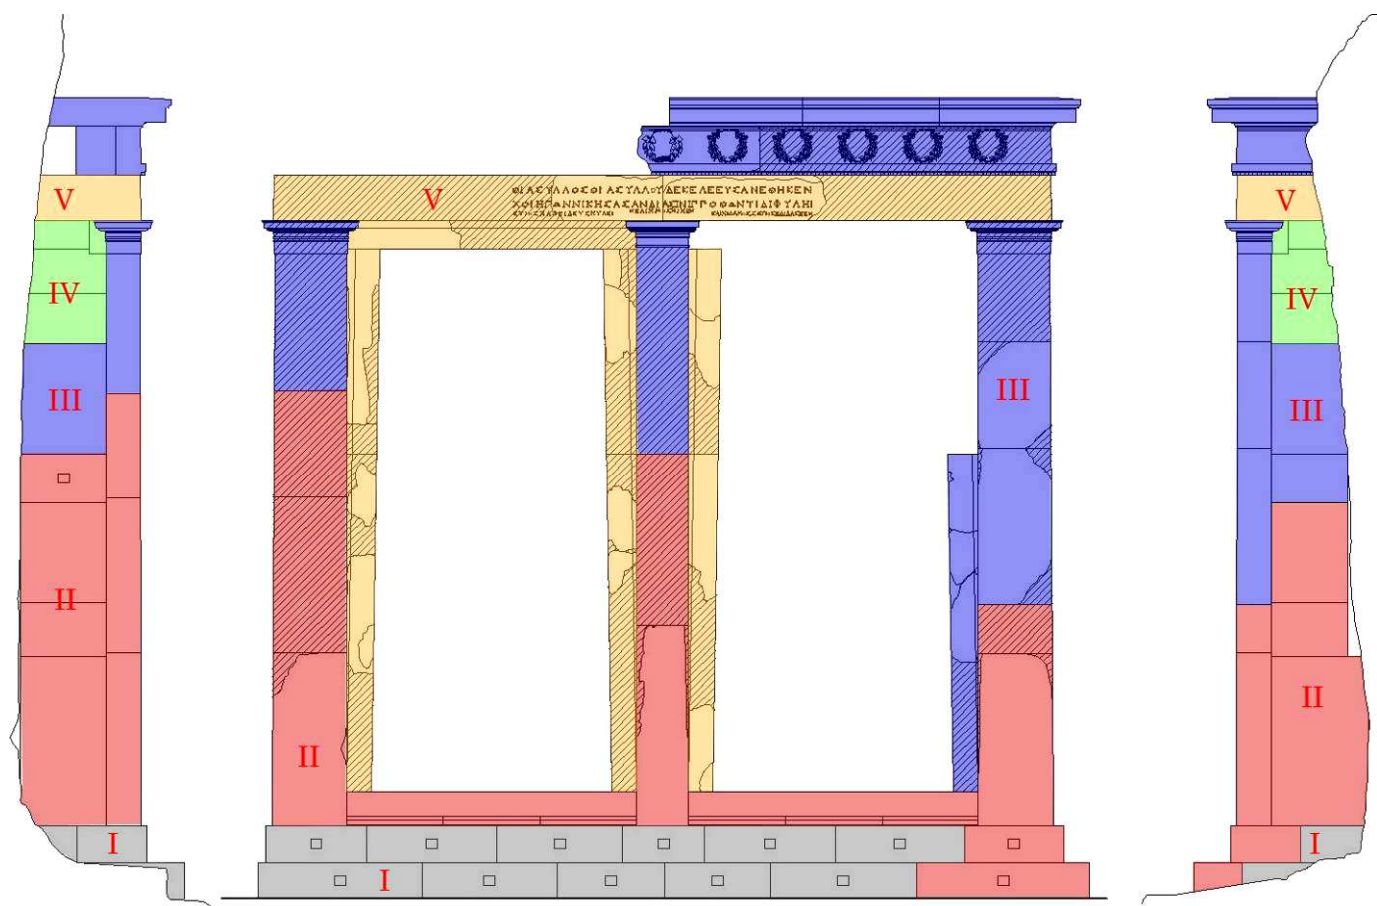

Προγραμματισμός εργασιών στο Χορηγικό Μνημείο του Θρασύλλου		
Φάσεις αποκατάστασης		Χρόνοι (σε μήνες)
<b>I</b> (γκρι χρώμα)	Περιοχή του μνημείου που δεν αποσυναρμολογήθηκε αλλά συντηρήθηκε επί τόπου	Εργασίες που έγιναν πριν την έναρξη της προγραμματικής σύμβασης
<b>II</b> (κόκκινο χρώμα)	Συμπληρωμένα αρχαία ή εξ ολοκλήρου ανακατασκευασμένα από νέο μάρμαρο αρχιτεκτονικά μέλη σε τελική τοποθέτηση. Ήδη συμπληρωμένα αρχαία ή ανακατασκευασμένα αρχιτεκτονικά μέλη σε παρακαταθήκη. Η τελική τοποθέτηση/προσαρμογή τους προϋποθέτει την παράλληλη αποκατάσταση και σύνδεση των περιθυρωμάτων.	Εργασίες που έγιναν πριν την έναρξη της προγραμματικής σύμβασης
<b>III</b> (μπλε χρώμα)	8 αρχιτ. μέλη μικρού μεγέθους από νέο μάρμαρο (εκκρεμεί η προμήθεια του υλικού και η κατασκευή τους από το συνεργείο)	6
<b>IV</b> (μπεζ χρώμα)	Ομάδα αρχιτ. μελών μεγάλου μεγέθους (7 δομικά μέρη περιθυρωμάτων και 2 επιστύλια). Απαιτούν σύνθετες συμπληρώσεις και θα ανατεθούν σε εξωτερικούς αναδόχους	6+18
	Τοποθετήσεις, προσαρμογές, αφαίρεση άπεργων, τελικές διαμορφώσεις από το συνεργείο, φινιρίσματα	12
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>36</b>

## Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των βάθρων και του αντιγράφου του αγάλματος του Μενάνδρου στην ανατολική πάροδο

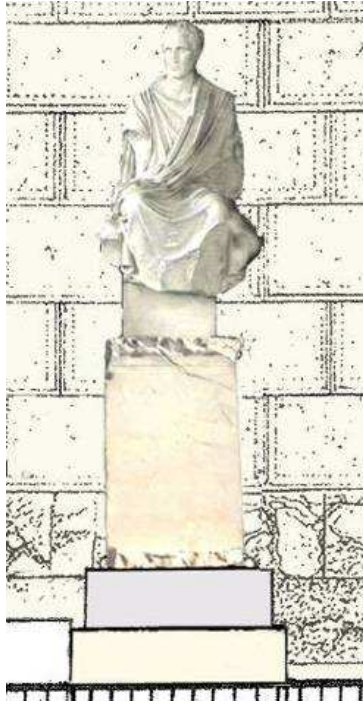

Βάθρα Ανατολικής Παρόδου	
Υπολειπόμενες Εργασίες	Χρόνος (σε μήνες)
Κατασκευή ελαστικής μήτρας και εκμάγευση χυτού αντιγράφου του αγάλματος του Μενάνδρου και φερόντων στοιχείων-Προσαρμογή μεταξύ τους και στην άνω επιφάνεια του ήδη αποκατεστημένου αρχαίου βάθρου	4

**Γενική Σημείωση:** Η εκτίμηση της χρονικής διάρκειας ολοκλήρωσης των επιμέρους φάσεων κάθε έργου αφορούν σε μήνες καθαρής εργασίας μετά την αναγκαία στελέχωση των συνεργείων και την έγκαιρη από πλευράς ΤΔΠΕΑΕ, έγκριση των αναθέσεων και λοιπών οργανωτικών θεμάτων.
